



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ
ПРОГРАММА**

**"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
СПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2016 - 2020 ГОДЫ"**

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ.

- ✓ *Наименование Программы* - федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы"
- ✓ *Дата принятия решения о разработке Программы* - распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 января 2014 г. № 2-р
- ✓ *Государственный заказчик Программы* - Министерство спорта Российской Федерации
- ✓ *Основной разработчик Программы* - Министерство спорта Российской Федерации



Цели Программы:

- ? создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом
- ? повышение эффективности подготовки спортсменов в спорте высших достижений.



Задачами Программы являются:

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта,
- строительство спортивных объектов шаговой доступности по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, с определением предельной цены на строительство этих объектов;
- развитие материально-технической базы спорта высших достижений для подготовки спортсменов, в том числе по наиболее массовым видам спорта, не включенным в программы Олимпийских и Паралимпийских игр (спортивная аэробика, акробатический рок-н-ролл, единоборства, бейсбол, софтбол), в условиях различных природно- климатических зон (среднегорье, Черноморское побережье, Дальний Восток, Прибайкалье) и соответствующего научного сопровождения тренировочных процессов;
- создание условий для подготовки и совершенствования спортсменов и тренеров с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки;
- создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва;
- развитие спортивной инфраструктуры Северо-Кавказского федерального округа;
- развитие спортивной инфраструктуры Дальневосточного федерального округа;
- развитие спортивной инфраструктуры Крымского федерального округа



I ЭТАП (2016-2018)

- ? строительство и реконструкция инфраструктуры федеральных спортивно-тренировочных центров для подготовки спортсменов
- ? завершение строительства "Государственного училища (техникума) олимпийского резерва по хоккею" (г. Ярославль), которое начато в рамках Программы на 2006 - 2015 годы;
- ? строительство инфраструктуры федеральных спортивно-тренировочных центров (6 центров)
- ? создание научно-методической базы, повышающей эффективность решения задач Программы;
- ? разработка системы отчетности, характеризующей экономическую эффективность реализации Программы;
- ? обеспечение информированности общества
- ? поддержка реализации региональных программ развития физической культуры и спорта, направленных на развитие массового детско-юношеского спорта
- ? развитие спортивной инфраструктуры Северо-Кавказского федерального округа, Дальневосточного федерального округа и Крымского федерального округа.



II ЭТАП (2019-2020)

- ? строительство спортивно-тренировочного центра (один новый центр) для подготовки спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации по наиболее массовым видам спорта, (спортивная аэробика, акробатический рок-н-ролл, единоборства, бейсбол, софтбол);



ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ


- ? единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта, - 27740 человек;
- ? эффективность использования объектов спорта - с 60 процентов в 2015 году до 80 процентов в 2020 году;
- ? доля видов спорта, включенных в программы Олимпийских и Паралимпийских игр, и наиболее массовых видов спорта, не включенных в эти программы, по которым спортивные сборные команды Российской Федерации обеспечены тренировочной инфраструктурой на территории Российской Федерации, в общем количестве видов спорта, включенных в программы Олимпийских и Паралимпийских игр, и наиболее массовых видов спорта, не включенных в эти программы, - с 76 процентов в 2015 году до 100 процентов в 2020 году;
- ? доля видов спорта, включенных в программы Олимпийских и Паралимпийских игр, по которым спортивные сборные команды Российской Федерации обеспечены спортивной инфраструктурой для акклиматизации в условиях среднегорья, Черноморского побережья и в Прибайкалье (на территории Российской Федерации), в общем количестве видов спорта, включенных в программы Олимпийских и Паралимпийских игр, - с 35 процентов в 2015 году до 100 процентов в 2020 году;
- ? количество квалифицированных тренеров и тренеров - преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности, - с 320 тыс. человек в 2015 году до 360 тыс. человек в 2020 году;




Сведения о целевых индикаторах и показателях реализации федеральных целевых программ (подпрограмм)

(заполняется за январь - декабрь)

№ строки (индикатора)	Наименование целевых индикаторов и показателей	Базовый показатель по программе (подпрограмме)	Предусмотрено на отчетный год	Выполнено за отчетный год
	Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"		13 6 0000	
1	2	5	6	7
1	Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом)	5400 чел.	5400 чел.	6706 чел.
2	Эффективность использования существующих объектов спорта	62%	62%	50,50%
3	Доля видов спорта, включенных в программы Олимпийских и Паралимпийских игр, и наиболее массовых видов спорта, не включенных в эти программы, по которым спортивные сборные команды Российской Федерации обеспечены тренировочной инфраструктурой на территории Российской Федерации, в общем количестве видов спорта, включенных в программы Олимпийских и Паралимпийских игр, и наиболее массовых видов спорта, не включенных в эти программы	80%	80%	88,70%
4	Доля видов спорта, включенных в программы Олимпийских и Паралимпийских игр, по которым спортивные сборные команды Российской Федерации обеспечены спортивной инфраструктурой для акклиматизации в условиях среднегорья, Черноморского побережья и в Прибайкалье (на территории Российской Федерации), в общем количестве видов спорта, включенных в программы Олимпийских и Паралимпийских игр	35%	35%	39,70%
5	Количество квалифицированных тренеров и тренеров - преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности (нарастающим итогом)	326 тыс. чел.	326 тыс. чел.	355 тыс. чел.
6	Количество спортивных региональных центров, введенных в эксплуатацию в рамках Программы (нарастающим итогом)	-	-	-
7	Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет	38%	38%	38,20%
8	Доля спортсменно-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва	46,50%	46,55%	47,30%
9	Доля спортсменно-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта"), в общем количестве спортсменно-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва	22,20%	22,20%	22,30%
10	Количество созданных в рамках Программы физкультурно-оздоровительных комплексов в Северо-Кавказском федеральном округе (нарастающим итогом)	1	1	-
11	Количество созданных в рамках Программы физкультурно-оздоровительных комплексов в Дальневосточном федеральном округе (нарастающим итогом)	1	1	1
12	Количество созданных в рамках Программы объектов для массового спорта в Крымском федеральном округе (нарастающим итогом)	-	-	-




ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

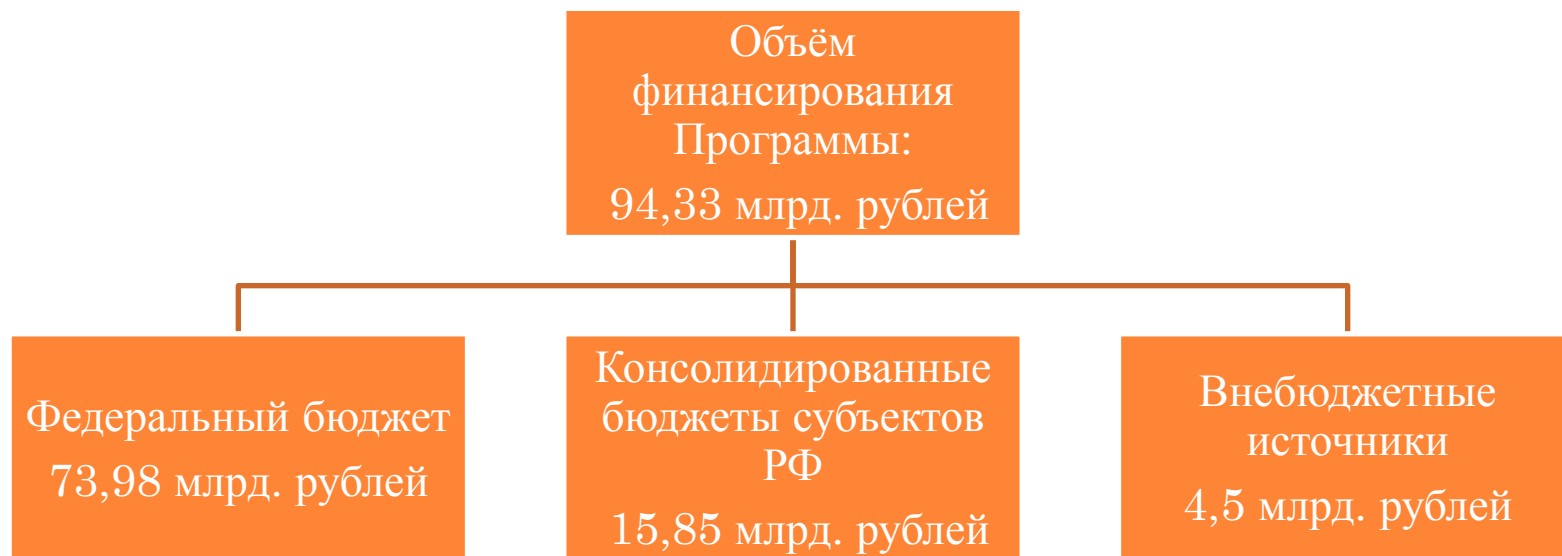

Обобщенные сведения о реализации федеральной целевой программы, ходе заключения контрактов, а также ее финансировании и выполнении мероприятий федеральной целевой программы (в денежном выражении) за 2016 год

федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы", Министр России

№ п/п	Наименования источников финансирования и направления расходов	Бюджетные и/или внебюджетные назначения на 2016 год (тыс. рублей)	Освоено с начала года (тыс. рублей)	Кассовые расходы * и фактические расходы ** за 2016 год (тыс. рублей)	Количество контрактов (соглашений), действующих в 2016 году, единиц		Стоимость работ 2016 года по действующим контрактам (соглашениям)	
					всего, включая контракты прошлых лет	контракты (соглашения), заключенные за 2016 год	всего, включая контракты прошлых лет (тыс. рублей)	контракты, заключенные за 2016 год (тыс. рублей)
1.	Всего по ФЦП:	11 264 354,40	7 042 493,17	8 463 195,52	231	230	9 293 173,45	8 493 173,45
	в том числе:							
1.1.	федеральный бюджет*	8 010 824,40	5 776 966,52	7 197 668,87	130	129	7 906 083,37	7 106 083,37
1.2.	бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты**	2 623 530,00	1 260 900,25	1 260 900,25	98	98	1 366 991,10	1 366 991,10
1.3.	внебюджетные источники**	630 000,00	4 626,40	4 626,40	3	3	20 098,98	20 098,98
2.	Капитальные вложения,	9 389 991,00	5 786 958,04	7 205 727,69	103	102	7 965 396,22	7 165 396,22
2.1.	федеральный бюджет*	6 838 601,00	4 624 848,95	6 043 618,60	63	62	6 733 859,97	5 933 859,97
	в том числе:							
	бюджетные инвестиции	4 507 211,00	2 600 587,23	3 858 657,10	35	34	4 402 460,97	3 602 460,97
	субсидии в бюджеты гос. собственности РФ	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	субсидии субъектам РФ	2 331 390,00	1 934 261,72	2 184 966,41	28	28	2 331 390,00	2 331 390,00
2.2.	бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты**	2 201 390,00	1 161 109,09	1 161 109,09	38	38	1 214 937,27	1 214 937,27
2.3.	внебюджетные источники**	350 000,00	1 000,00	1 000,00	2	2	16 598,98	16 598,98
3	ННОКР, всего	19 325,00	19 325,00	19 325,00	3	3	19 325,00	19 325,00
3.1.	федеральный бюджет*	19 325,00	19 325,00	19 325,00	3	3	19 325,00	19 325,00
3.2.	бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты**	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
3.3.	внебюджетные источники**	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
4.	Прочие нужды, всего	1 855 038,40	1 236 210,13	1 238 142,83	125	125	1 308 452,23	1 308 452,23
4.1.	федеральный бюджет*	1 152 898,40	1 132 792,57	1 134 725,27	64	64	1 152 898,40	1 152 898,40
	в том числе:							
	в рамках госконтрактов	167 900,00	167 900,00	167 900,00	2	2	167 900,00	167 900,00
	в рамках субсидии субъектам РФ	984 998,40	964 892,57	966 825,27	62	62	984 998,40	984 998,40
4.2.	бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты**	422 140,00	99 791,16	99 791,16	60	60	152 053,83	152 053,83
4.3.	внебюджетные источники**	280 000,00	3 626,40	3 626,40	1	1	3 500,00	3 500,00



ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ

- ? количество спортивных региональных центров, введенных в эксплуатацию в рамках Программы, - 24; доля граждан, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет - с 35 процентов в 2015 году до 50 процентов в 2020 году;
- ? доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва, - 4 с 46 процентов в 2015 году до 48,5 процента в 2020 году;
- ? доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта"), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва - с 22 процентов в 2015 году до 23 процентов в 2020 году;
- ? количество созданных в рамках Программы в Северо-Кавказском федеральном округе физкультурно-оздоровительных комплексов - 10, спортивных объектов в составе федеральных спортивно-тренировочных центров - 6;
- ? количество созданных в рамках Программы в Дальневосточном федеральном округе физкультурно-оздоровительных комплексов - 12, спортивных объектов в составе федеральных спортивно-тренировочных центров - 3;
- ? количество созданных в рамках Программы объектов для массового спорта в Крымском федеральном округе - 8, спортивных объектов в составе федеральных спортивно-тренировочных центров - 2



**Результаты реализации программных мероприятий по направлению «капитальные вложения» за 2016 год
в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"
Российской Федерации**

Мини

(наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик))

№ п/п	Наименование строок, объектов, мероприятий по направлению «капитальные вложения»	Источники и объемы финансирования за 2016 год (тыс. рублей)						Обобщенные показатели (тыс. рублей)			Выполненные работы за 2016 год (в натуральных показ.)
		Федеральный бюджет		Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты		Внебюджетные источники		Общий объем финансирования		Освоено с начала года за счет всех источников	
		Бюджетные назначения по программе на 2016 год	Кассовые расходы госзаказ-чика за 2016 год	Предусмотрено утвержден-ной ФЦП на 2016 год	Фактические расходы за 2016 год	Предусмот-рено утвержден-ной ФЦП на 2016 год	Фактичес-кие расходы за 2016 год	Предусмот- рено на 2016 год	Кассовые расходы и факт расход за 2016 год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Всего по ФЦП:	6 838 601,00	6 043 618,60	2 201 390,00	1 161 109,09	350 000,00	1 000,00	9 389 991,00	7 205 727,69	5 786 958,04	
	в том числе:										
2.	Бюджетные инвестиции, всего	4 507 211,00	3 858 652,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4 507 211,00	3 858 652,19	2 690 587,23	
	в том числе:										
	Строительство и реконструкция инфраструктуры федеральных спортивно-тренировочных центров для подготовки спортсменов сборных команд Российской Федерации										



РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «КАПИТАЛЬНЫЕ
ВЛОЖЕНИЯ» ЗА 2016 ГОД
В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2016-2020 ГОДЫ"
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- ? Реконструкция Адыгейского республиканского стадиона в г. Майкопе (третий пусковой комплекс - строительство северной трибуны).
- ? «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Нижний Тагил».
- ? «Ледовая спортивная арена «Неоплан» по адресу: ул. Куйбышева, 32а, г. Екатеринбург».
- ? «Региональный центр спортивной подготовки в п. Вершина Теи (вторая очередь)", Республика Хакасия.
- ? Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградская государственная академия физической культуры", г. Волгоград.
- ? Реконструкция объектов спортивной базы в г. Кисловодске.



**РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ НИОКР ЗА
2016 ГОД В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА
2016-2020 ГОДЫ", Минспорт России.**

№ п/п*	Наименование подпрограммы, мероприятия, темы НИОКР*; вид НИОКР, реквизиты госконтракта (соглашения на предоставление гранта), и спонсор, номер и дата государственной регистрации контракта (для НИОКР гражданского назначения)	Период выполнения НИОКР	Дата проведения конкурса	ГРБС (код)	Источники и объемы финансирования НИОКР			Созданные в рамках контракта охраняемые результаты интеллектуальной деятельности (объекты интеллектуальной собственности)	Изначально учтены или планируются к учету на балансе в виде нематериального актива (стоимость, балансодержатель)	Сведения о закреплении прав и использовании объекта интеллектуальной собственности	Описание результатов выполненных работ за отчетный период
					На весь период реализации мероприятия по источникам	Предусмотрено на 2016 год по источникам	Фактические расходы за 2016 год по источникам				
					федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет				
					бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ				
					внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	всего			
					за отчетный период						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Объем финансирования НИОКР по программе					19 325,00	19 325,00	19 325,00				
всего по программе					0,00	0,00	0,00				
					0,00	0,00	0,00				
всего по программе					19 325,00	19 325,00	0,00				
1.	Научные разработки в области спорта высших достижений				19 325,00	19 325,00	19 325,00				
					0,00	0,00	0,00				
					0,00	0,00	0,00				
	всего по мероприятию, тематическому направлению				19 325,00	19 325,00	0,00				
1.1	разработка сводов правил по строительству спортивных сооружений, гос. контракт от 14.06.2016 №284, Фонд "Международный фонд олимпийских проектов"	2016	15.04.2016	777	9 700,00	9 700,00	9 700,00	Разработаны проекты сводов правил по строительству спортивных сооружений (ледовые арены, плавательные бассейны, многофункциональные спортивные комплексы (универсальные спортивные залы, плоскостные спортивные сооружения). В настоящее время проекты проходят процедуру регистрации в соответствии с установленным порядком			
					0,00	0,00	0,00				
					0,00	0,00	0,00				
1.2	разработка государственных стандартов на спортивное оборудование и инвентарь, гос. контракт от 2.06.2016 №257, Саморегулируемая организация "Национальное партнерство" "Органическое объединение национальных производителей в сфере физической культуры и спорта "Промспорт"	2016	15.04.2016	777	7 200,00	7 200,00	7 200,00	Разработаны проекты национальных стандартов по требованиям безопасности и методам испытаний на спортивное оборудование и инвентарь, используемое для лыжных гонок, коньки, спортивной гимнастики, а также на тренажеры силовые для открытых площадок (10 проектов стандартов). В настоящее время проекты стандартов проходят процедуру регистрации в соответствии с установленным порядком			
					0,00	0,00	0,00				
					0,00	0,00	0,00				
1.3	совершенствование научно-методической базы в целях повышения эффективности использования спортивных объектов, гос. контракт от 12.05.2016 №182, ООО "Центральная научно-исследовательская лаборатория в области физической культуры и спорта"	2016	15.04.2016	777	2 425,00	2 425,00	2 425,00	Разработан проект сводов правил по эксплуатации спортивных сооружений. В настоящее время проект проходит процедуру регистрации в соответствии с установленным порядком			
					0,00	0,00	0,00				
					0,00	0,00	0,00				

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ "ПРОЧИЕ НУЖДЫ" ЗА 2016 ГОД В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ.

№ п/п	Наименование мероприятия*, реквизиты госконтракта, исполнитель (для субсидии - предмет и реквизиты соглашения, получатель)	Код вида расходов	Вид работ, услуг**	Период выполнения работ	Дата размещения заказа для государственных нужд	ГРБС (код)	источники и объемы финансирования по		
							всего за период реализации мероприятия по источникам	предусмотрено на 2016 г. по источникам	фактические расходы за 2016 г. по источникам
1	2	3	4	5	6	7	федеральный бюджет субъектов РФ внебюджетные источники	федеральный бюджет субъектов РФ внебюджетные источники	федеральный бюджет субъектов РФ внебюджетные источники
8	9	10							
	Объем финансирования "прочих нужд" по ФЦИ					777	1 158 998,40	1 152 898,40	1 134 725,27
							422 140,00	422 140,00	99 791,16
							280 000,00	280 000,00	3 626,40
	всего по программе						1 861 138,40	1 855 038,40	1 238 142,83
1.	Закупка искусственных покрытий для футбольных полей для спортивных детско-юношеских школ					777	279 999,40	279 999,40	277 167,40
							120 000,00	120 000,00	75 937,58
							0,00	0,00	3 625,80
	всего по мероприятию, тематическому направлению						399 999,40	399 999,40	356 730,78
	Закупка спортивного оборудования для спортивных детско-юношеских школ олимпийского резерва					777	504 999,00	504 999,00	489 657,88
							302 140,00	302 140,00	23 853,58
							280 000,00	280 000,00	0,60
	всего по мероприятию, тематическому направлению						1 087 139,00	1 087 139,00	513 512,06
	Развитие инфраструктуры региональных спортивно-тренировочных центров по базовым видам спорта государственной собственности Российской Федерации, переданных в эксплуатацию обществу «Динамо»					777	200 000,00	200 000,00	199 999,99
							0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
	всего по мероприятию, тематическому направлению						200 000,00	200 000,00	199 999,99
	Сопровождение реализации Программы (содержание Дирекции)					777	85 000,00	85 000,00	85 000,00
							0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
	всего по мероприятию, тематическому направлению						85 000,00	85 000,00	85 000,00
	Информационно-пропагандистское обеспечение Программы					777	89 000,00	82 900,00	82 900,00
							0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00



Сведения о государственных контрактах, действующих в 2016 году
в рамках федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"


(наименование федеральной целевой программы)

	Количество заключенных контрактов, шт.		Объем финансирования за счет средств федерального бюджета в 2016 году, тыс. рублей	
	Всего	в 2016 году	Всего	заключенные в 2016 году
	1	2	3	4
Государственные контракты, действующие в 2016 году, всего:	130	129	7 906 083,37	7 106 083,37
в том числе				
долгосрочные государственные контракты, всего:	0	0	0,00	0,00



**СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТАХ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В РАМКАХ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ В ПЕРИОД С 2016 ПО 2022 ГОДЫ**

"Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"						
	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	3	4	5	6	7	8
Объемы финансирования, предусмотренные на реализацию мероприятий программы (план)	7 739 397,30	6 517 973,00	7 735 421,80	18 094 240,00		
в том числе:						
в рамках госконтрактов	4 253 007,30	3 031 583,00	4 249 031,80	11 540 030,00		
в рамках субсидий, грантов	3 486 390,00	3 486 390,00	3 486 390,00	6 554 210,00		
Объемы финансирования по заключенным контрактам (факт)	1 891 776,94	210 800,00	221 500,00	0,00		
в том числе:						
заключено госконтрактов	1 891 776,94	210 800,00	221 500,00	0,00		
заключено договоров, контрактов, соглашений о предоставлении субсидий, грантов	0,00	0,00	0,00	0,00		
Уровень контрактования (в процентах)	16	3,2	2,9	0		



**Ключевые программные мероприятия
на 2017 год федеральной целевой программы «Развитие физической
культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»
По направлению «капитальные вложения»:**

Наименование объекта или стройки ⁽¹⁾	Состояние объекта и уровень технической готовности на 1 января 2017 года ⁽²⁾ (в %%)	Стоимость плановых работ в 2017 году ⁽³⁾ , тыс. рублей	Плановые виды работ и ожидаемые результаты ⁽⁴⁾ в 2017 году
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Южный федеральный центр спортивной подготовки", г. Сочи, Краснодарский край Реконструкция объектов спортивной базы в г. Кисловодске 3-й этап. Нижняя база	70	72474,0 / 72474,0	Завершение строительно-монтажных работ. Ввод объекта в эксплуатацию
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Южный федеральный центр спортивной подготовки", г. Сочи, Краснодарский край Реконструкция объектов спортивной базы в г. Кисловодске 4-й этап. Верхняя база	30	166800,0 / 166800,0	Завершение строительно-монтажных работ. Ввод объекта в эксплуатацию
Федеральное государственное бюджетное учреждение профессиональная образовательная организация "Государственное училище (техникум) олимпийского резерва по хоккею", г. Ярославль Федеральный центр подготовки молодежного олимпийского резерва по хоккею. 1-й этап	60	517934,0 / 517934,0	Завершение строительно-монтажных работ. Ввод объекта в эксплуатацию
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградская государственная академия физической культуры", г. Волгоград Реконструкция котельной	95	13030,0 / 13030,0	Завершение строительно-монтажных работ. Ввод объекта в эксплуатацию



По направлению НИОКР:

Наименование НИОКР, исполнитель (для переходящих работ прошлых лет) ⁽¹⁾	Стоимость работ в 2017 году, тыс. рублей ⁽²⁾	Плановый уровень практической реализации ⁽³⁾	Запланированные виды работ и ожидаемые результаты ⁽⁴⁾ в 2017 году
Разработка научно обоснованных предложений по совершенствованию сводов правил по строительству спортивных сооружений	7500,0	отчет	Проекты сводов правил по строительству спортивных сооружений (сооружения для легкой атлетики, многофункциональные спортивные комплексы (физкультурно-оздоровительные комплексы, сооружения для стрелковых видов спорта)
Разработка научно обоснованных предложений по содержанию национальных стандартов на спортивное оборудование и инвентарь	10000,0	отчет	Проекты национальных стандартов по требованиям безопасности и методам испытаний на спортивное оборудование и инвентарь, используемое для тяжелой атлетики, легкой атлетики, а также на тренажеры стационарные (не менее 12 стандартов)
Разработка научно обоснованных методических рекомендаций по эффективной эксплуатации спортивного объекта на основе сводов правил по эксплуатации	2500,0	отчет	Методические рекомендации по эффективной эксплуатации спортивного объекта на основе сводов правил по эксплуатации.

По направлению «прочие нужды»:

Наименование мероприятия, поставки продукции, работы или услуги для государственных нужд ⁽¹⁾	Стоимость плановых работ в 2017 году, тыс. рублей ⁽²⁾	Основание ⁽³⁾ выполнения мероприятий	Ожидаемые результаты выполнения мероприятия ⁽⁴⁾ в 2017 году (в натуральных показателях)
Закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для спортивных детско-юношеских школ	280000,0		Поставка 25 комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для спортивных детско-юношеских школ
Закупка спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва	505000,0		Поставка 28 комплектов спортивного оборудования в спортивные школы и училища олимпийского резерва
Развитие инфраструктуры региональных спортивно-тренировочных центров по базовым видам спорта государственной собственности Российской Федерации, переданных в эксплуатацию обществу «Динамо»	200000,0		Проектирование региональных спортивно-тренировочных центров



По ФЦП за 2006-2015 годы было профинансировано 1140 спортивных объектов:

- Строительство и реконструкция финансировались по следующим направлениям: массовый спорт, спорт высших достижений, подпрограмма «Развитие футбола в Российской Федерации на 2008-2015 годы».
- **В рамках реализации направления "Массовый спорт" в регионах профинансировано строительство 710 спортивных объектов:**
 - **270** универсальных залов; **68** плавательных бассейнов;
 - **80** ледовых катков; **124** плоскостных сооружения;
 - **104** многофункциональных спортивных комплекса; **64** специализированных по виду спорта сооружения.
- **По направлению «Спорт высших достижений»** осуществлено строительство и реконструкция на **63** объектах и еще на **5** проведены проектно-изыскательские работы.
- **По подпрограмме "Развитие футбола в Российской Федерации на 2008-2015 годы"** введено в эксплуатацию **367** футбольных полей.

