


Отчет по готовности  
площадки  
BUD Beer Garden

Стадион «Фишт»  
Роман Картавенко

Июнь 2018г

# План расположения площадки и дизайн

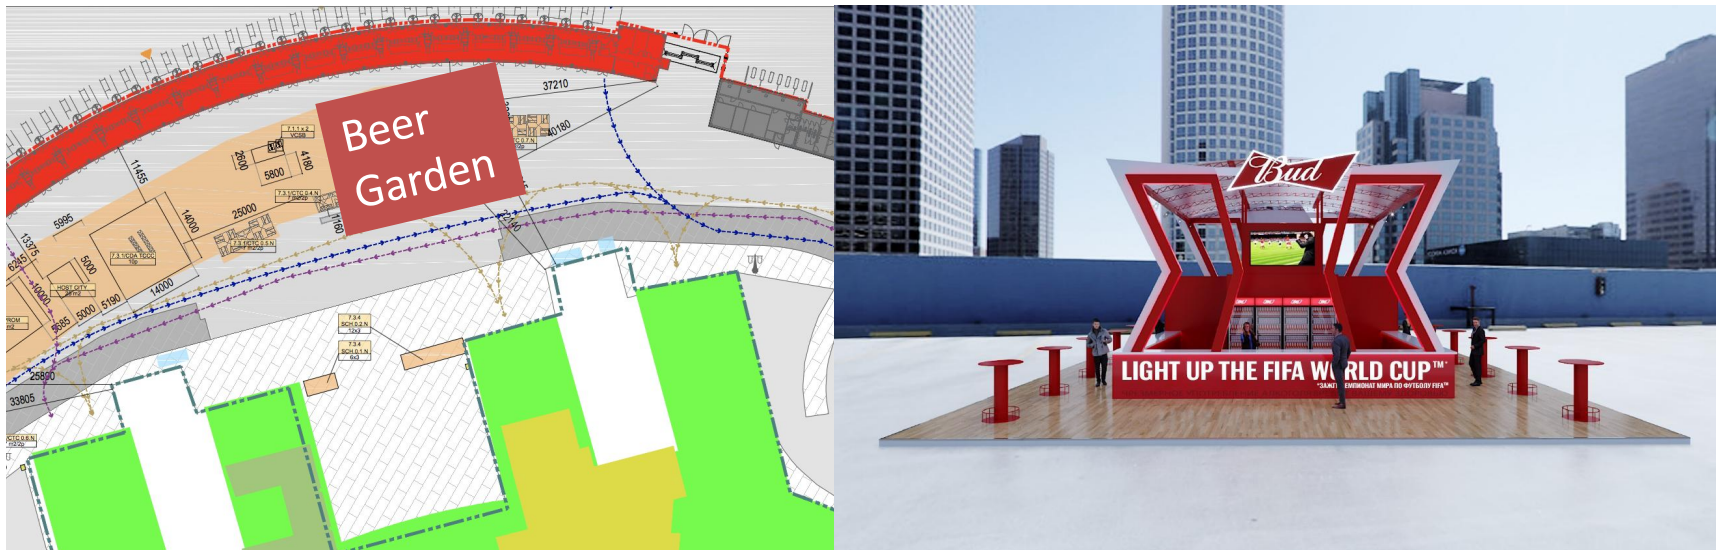

Согласно всем договорённостям компания-застройщик коммерческого дисплея начала застройку "Beer Garden" 7 июня по указанному мэппингу и дизайну.



7 июня




1. Разгрузка оборудования
2. Разметка площадки
3. Монтаж подиума (брус, фанера, закладные, выравнивание)
4. Прокладка коммутации

8 ИЮНЯ



1. Выравнивание подиума
2. Укладка декинга (первый этаж)
3. Подготовка элементов бара для дальнейшего сбора
4. Проверка коммутации

9 июня

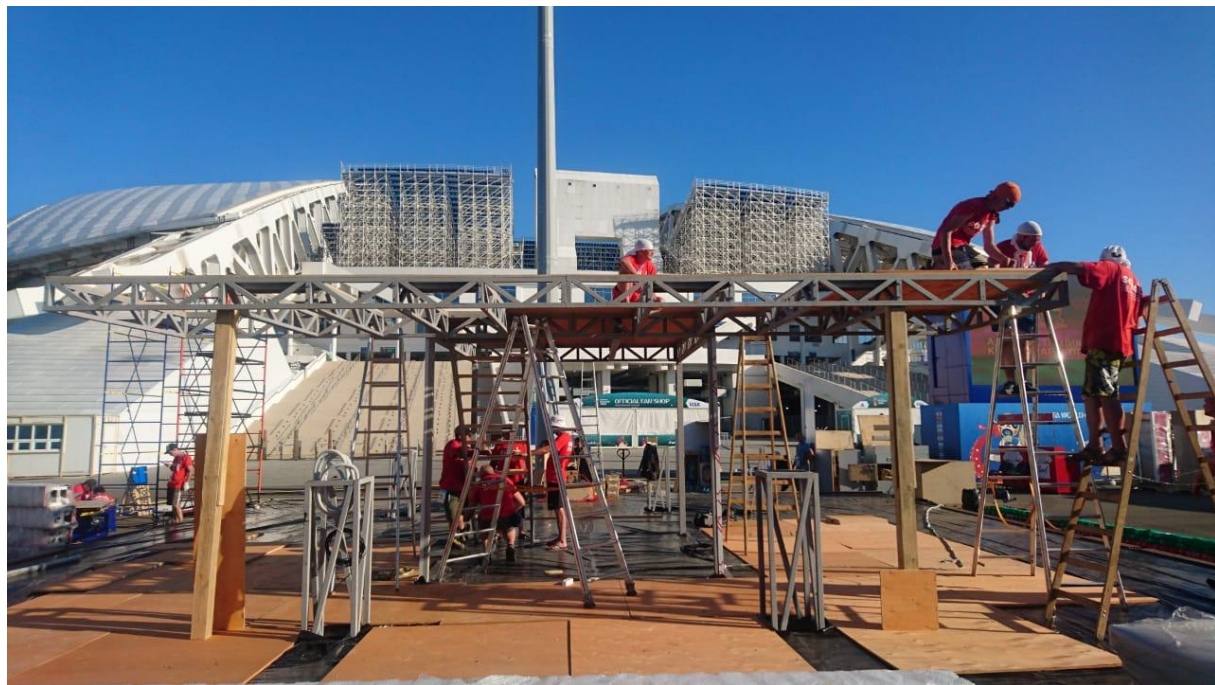

1. Укладка декинга (первый этаж)
2. Укладка защитного материала сверху декинга для дальнейших монтажных работ
3. Сборка баров

10 июня



1. Укладка пола (второй этаж)
2. Установка лестницы
3. Установка стен (первый этаж)
4. Сборка арок из колонн на земле
5. Установка арок

# 11 июня



1. Сборка потолочных балок , соединяющих арки между собой
2. Монтаж каркаса крыши. Установка радиусных ферм, перемычек (соединительных труб между фермами)
3. Укладка поликарбоната на крышу
4. Установка стен (второй этаж)




11 ИЮНЯ



1. Ограждение второго этажа
2. Логотипы – лайтбоксы
3. Торец подиума
4. Сборка мебели внутри подсобок, стеллажи, вешалки
5. Установка видео и звукового оборудования

14 июня

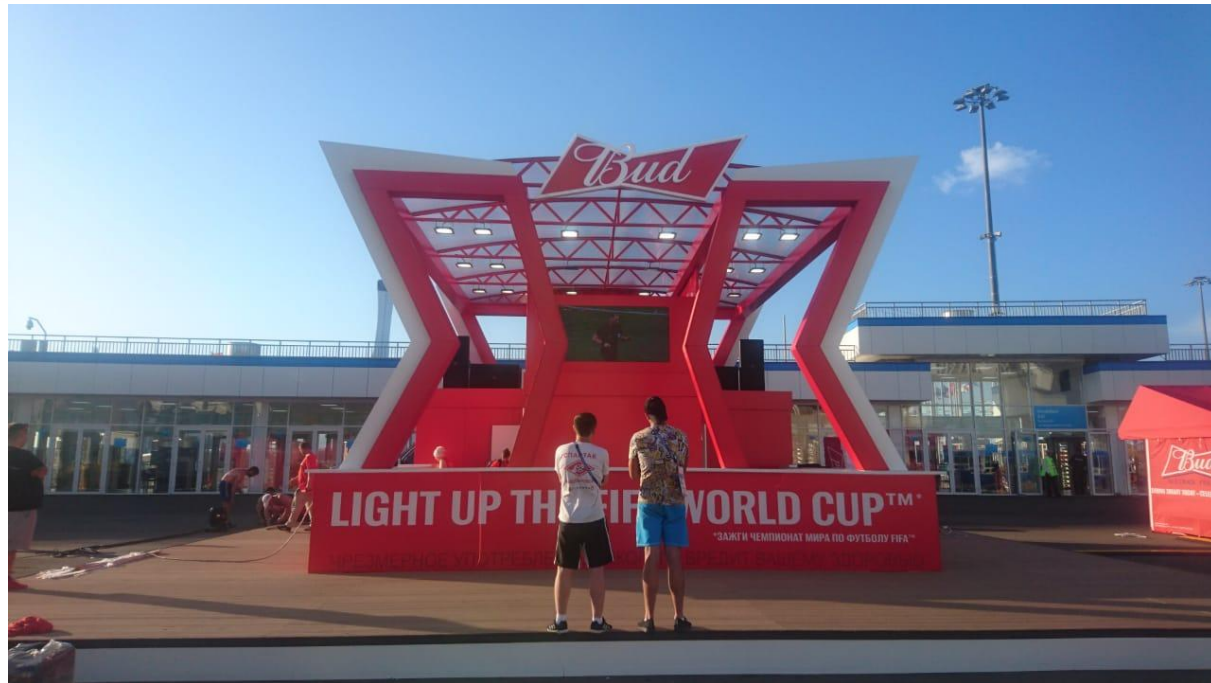

Коммерческий дисплей BUD на стадионе «Фишт» принят ответственным лицом со стороны FIFA – Инной Димурой и введен в эксплуатацию

# Отчет по подготовке площадки

Статус выполнения работ на конец июня

2018г.:

Наименование работ

Статус

Обзор и контроль постройки коммерческого дисплея

Сделано

Организация логистики материалов и оборудования для зоны коммерческого дисплея

Сделано

Установка холодильников, барных столов и меню Bud

Сделано

Помощь в активации спонсорских программ в дни матчей

Сделано

Помощь сотрудникам Octagon в осуществлении программы Bud MOTM

Сделано

Организация прохода людей, осуществляющих работы на дисплее

Сделано

Содействие Arena Foods в реализации продукции Bud

Сделано
